

Klubbstugan

Nu är vi på gång!


2022-03-31 fick vi bygglov och nu är det fyra veckor för överklagande. Sen ska det vara ett tekniskt samråd innan vi kan få startbesked och innan dess får man inte göra något.

Vi har gett sex företag möjlighet lämna anbud och på styrelsemötet 2022-04-04 beslutades anta en offert från Lundqvist Trävaru AB som bygger modulhus.

På ritningen nedan syns var huset ska ligga. Vi har även ritat in en altan men den kommer troligtvis senare. Fyra parkeringar på sidan av containern och en handikapp-parkering.




Framsidan på huset och gaveln mot hallen ser ut så här:

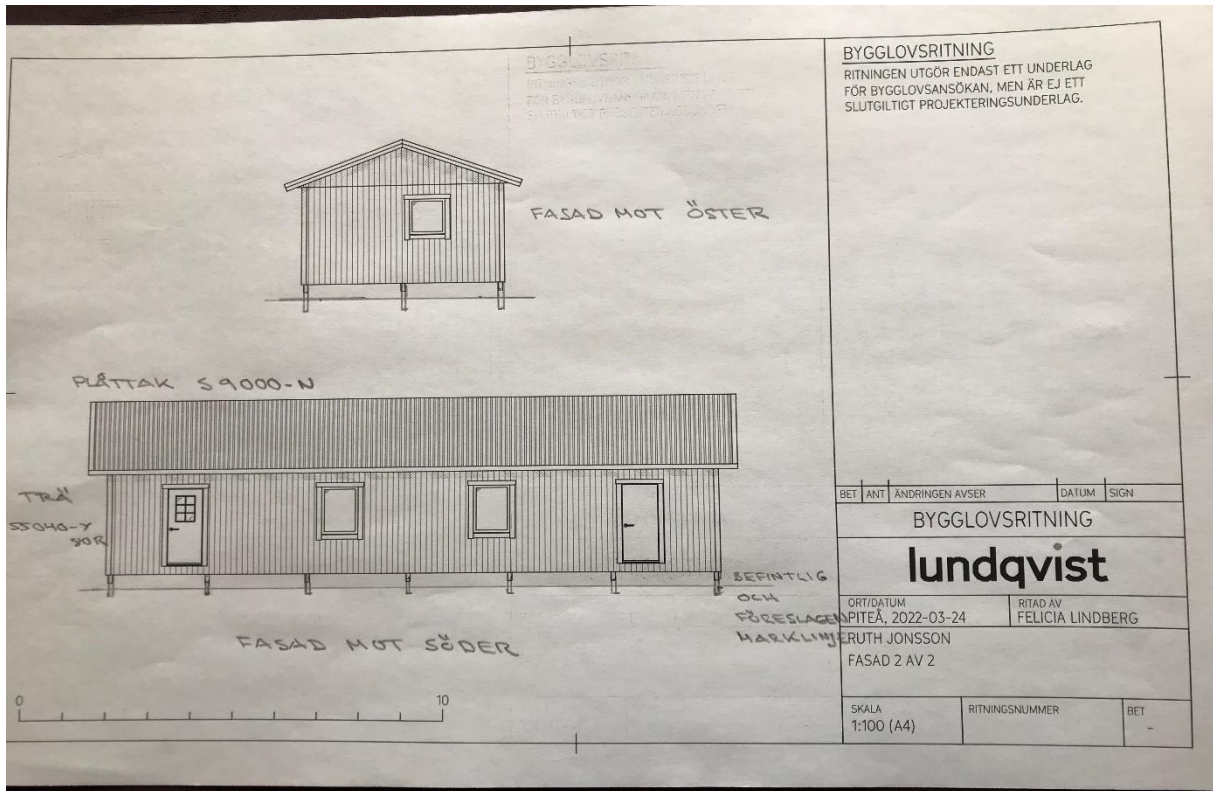

Det är ett rött trähus med svart plåttak som har torparegrund, dvs det står en bit ovanför marken.

Insidan på huset:

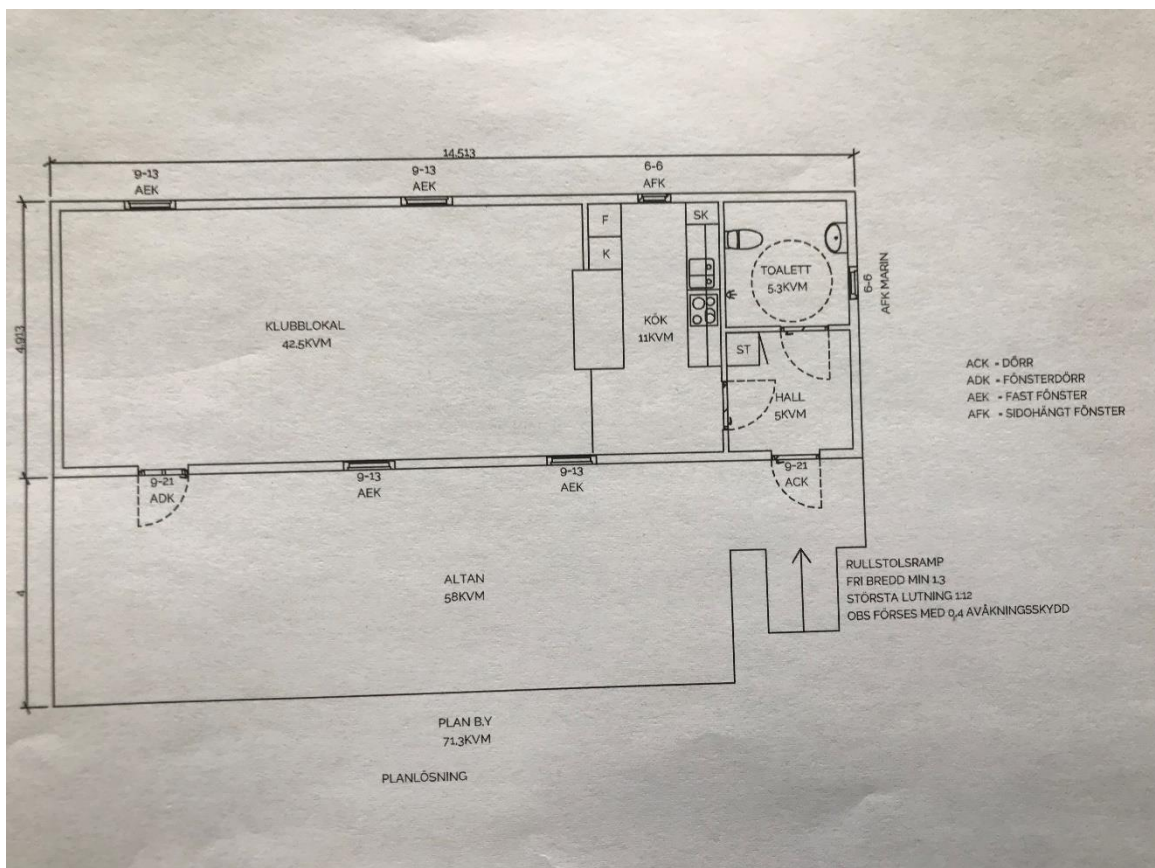

Det är en dusch på toaletten och i köket är det en säljdisk mot klubblokalen. Ingen vägg mellan kök och klubblokal även om det kan se ut så.

Idag har det kommit bekräftelse från byggföretaget med preliminär leverans vecka 38. Vi har även beställt montering från samma företag och grundmålning av utsidan. Montering sker 1-2 veckor efter leverans.

Innan dess ska grunden iordningsställas och dragnig för el, vatten och avlopp vara klar.

Det vi beställt är endast själva husstommen inkl isolering. Allt inne i huset (inre väggar, golvläggning, spackling, målning, toalett, kök etc) ska vi göra själva så där hoppas vi att vi har många som vill hjälpa till.

Om ni undrar över något kan ni kontakta mig på rut.rally@gmail.com.

För projektgruppen

Rut Jonsson
Projektledare
